



INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ABERTOS

28ª Reunião Ordinária do
Comitê Gestor

01/06/2021

PAUTAS DA REUNIÃO

Tema 1

Apresentação dos novos membros do Comitê

Tema 2

Informe sobre a execução das ações previstas no Plano de Ação da INDA 2021-2022

Tema 3

Aprovação dos novos prazos de implementação das ações nº 7 e 8

Apresentação dos novos membros do Comitê ■

Membros do CGINDA

Nome	Organização
Breno Barbosa Cerqueira Alves Marcelo de Brito Vidal	Controladoria-Geral da União - CGU
Renan Mendes Gaya Lopes dos Santos Augusto Herrmann Batista	Ministério da Economia - ME
Carlos Roberto Colares Gonsalves Maíra Murrieta Costa	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações - MCTI
Alexandre Gomide Lemos Jorge Vinícios da Rocha Moreira Eduardo Pires Fernandes	Ministério da Educação - MEC
Eduardo Flores Vieira Wesley Alexandre Tavares	Ministério da Cidadania
José Américo Serafim Mateus Magon Rodolpho	Ministério da Saúde - MS

Membros do CGINDA

Nome	Organização
Orlando Oliveira dos Santos Ronaldo Alves Nogueira	Casa Civil da Presidência da República
Rodrigo Lange Ronaldo Bento	Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP
Edson Leonardo Dalescio Sa Teles Allison Roberto Mazzuchelli Rodrigues	Secretaria-Geral da Presidência da República
Ronaldo Rodrigues Raposo Junior Andrea Borges Paim	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Manoel Galdino Pereira Neto	Transparência Brasil
Fernanda Lima	Universidade de Brasília (UNB)

Execução das ações do Plano de Ação da INDA 2021-2022 ■

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Ação	Responsável	Prazo inicial	Prazo final	Status
AÇÃO 1. Promover a abertura de bases de alto valor	CGU	Abr/21	Jul/22	Não iniciado
AÇÃO 2. Aprimorar o Framework de Dados Abertos para o governo federal	CGU	Abr/21	Set/22	Não iniciado
AÇÃO 3. Revisão geral das bases de dados publicadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos	CGU	Mar/21	Jan/22	Iniciado
AÇÃO 4. Realizar pesquisas sobre abertura e reúso de dados	CGU	Mar/21	Out/22	Iniciado

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Ação	Responsável	Prazo inicial	Prazo final	Status
AÇÃO 5. Realizar eventos de cocriação com o uso de dados abertos	CGU	Mar/21	Dez/22	Iniciado
AÇÃO 6. Programa continuado de orientação e capacitação em dados abertos e reuso de dados	CGU	Mar/21	Dez/22	Iniciado
AÇÃO 7. Reestruturação do Portal Brasileiro de Dados Abertos	CGU	Abr/21	Dez/22	Iniciado
AÇÃO 8. Catálogo de Bases de Dados Federais	Ministério da Economia - ME	Dez/20	Mar/21	Iniciado

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Ação	Responsável	Prazo inicial	Prazo final	Status
AÇÃO 9. Fomento a adesões de entes federativos e de órgãos dos demais Poderes da República ao Portal Brasileiro de Dados	CGU	Out/21	Jul/22	Não iniciado
AÇÃO 10. Normativo de reestruturação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - INDA	CGU	Mar/21	Dez/21	Iniciado

Detalhamento das ações iniciadas ■

AÇÃO 3 : Revisar bases publicadas no www.dados.gov.br

AÇÃO 3

Título da Ação	Ação 3. Revisão geral das bases de dados publicadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos
Descrição	Mobilizar todos os órgãos responsáveis por bases de dados catalogadas no Portal Brasileiro de Dados Abertos para: <ul style="list-style-type: none">• Validar e atualizar as bases catalogadas, levando em consideração que bases previstas nos PDAs não podem ser removidas, a não ser que justificadamente, com a devida atualização do plano.• Complementar informações catalogadas, especialmente quanto a metadados obrigatórios e periodicidade de atualização da base.
Período de implementação	Março/2021 a janeiro/2022
Órgão responsável pela ação	Controladoria-Geral da União
Órgão(s)/Entidade(s) colaborador(es)	Membros do CGINDA

AÇÃO 3: Revisar bases publicadas no Portal

Atividade	Data de início	Data de término	Responsável	Resultado verificável	Acompanhamento
Enviar ofício a todos os órgãos e entidades responsáveis pela catalogação de bases de dados, solicitando validação e atualização das bases catalogadas, e complementação das informações sobre as bases no Portal de Dados Abertos	Março/2021	Março/2021	CGU	Ofícios enviados	Os ofícios já foram elaborados e serão encaminhados aos órgãos cadastrados no Portal de Dados Abertos.
Evento online para orientar sobre a atividade de validação e atualização das bases de dados catalogadas, e complementação das informações sobre as bases no Portal de Dados Abertos	Abril/2021	Abril/2021	CGU	Evento realizado	Em razão do atraso no envio dos ofícios, o evento online foi adiado e deverá ocorrer no mês de junho/2021.

Ação 4: Realizar pesquisas sobre abertura e uso de dados

AÇÃO 4	
Título da Ação	Ação 4. Realizar pesquisas sobre abertura e reúso de dados.
Descrição	Elaborar e aplicar questionário de pesquisa com os seguintes objetivos: <ul style="list-style-type: none">• Identificar as dificuldades que impedem um maior envolvimento dos consumidores de dados publicados pelo governo federal.• Identificar principais problemas dos órgãos para a abertura e compartilhamento de dados.
Período de implementação	Março/2021 a outubro/2022
Órgão responsável pela ação	Controladoria-Geral da União
Órgão(s)/Entidade(s) colaborador(es)	

Ação 4: Realizar pesquisas sobre abertura e uso de dados

Atividade	Data de início	Data de término	Responsável	Resultado verificável	Acompanhamento
Aplicar pesquisa sobre o uso de dados abertos por parte do setor privado	Março/2021	Abril/2021	CGU	Pesquisa aplicada	O formulário da pesquisa foi finalizado e a pesquisa deverá ser aplicada a partir do mês de junho/2021.

Ação 5: Realizar eventos de dados abertos

AÇÃO 5	
Título da Ação	Ação 5. Realizar eventos de fomento à cocriação com o uso de dados abertos.
Descrição	Promover eventos para incentivar o consumo de dados abertos por parte da sociedade.
Período de implementação	Março/2021 a dezembro/2022
Órgão responsável pela ação	Controladoria-Geral da União
Órgão(s)/Entidade(s) colaborador(es)	Identificar possíveis órgãos colaboradores

Ação 5: Realizar eventos de dados abertos

Atividade	Data de início	Data de término	Responsável	Resultado verificável	Acompanhamento
Planejamento da programação	Março/2021	Junho/2021	CGU	Planejamento definido	O planejamento se encontra em desenvolvimento na Coordenação-Geral de Governo Aberto e Transparência; entrevistas estão sendo realizadas com a sociedade civil e setor privado para desenho do modelo de realização. Orçamento para a ação definido.

Ação 6: Capacitar em dados abertos e reuso de dados

AÇÃO 6	
Título da Ação	Ação 6. Programa continuado de orientação e capacitação em dados abertos e reuso de dados.
Descrição	<p>Programa com linhas temáticas de capacitação, realizado por meio de eventos, com a colaboração dos diversos atores do ecossistema de dados abertos</p> <ul style="list-style-type: none">• Público: servidores públicos, indivíduos/grupos ativos no controle social de políticas públicas, empresas privadas, pesquisadores, jornalistas, inovadores sociais.• Linhas temáticas: (1) Dados abertos: conceitos, boas práticas e tecnologias; (2) Política de dados abertos (framework, Portal, PDAs); (3) Conhecendo as bases; (4) Reuso de dados públicos.
Período de implementação	Março/2021 a dezembro/2022
Órgão responsável pela ação	Controladoria-Geral da União
Órgão(s)/Entidade(s) colaborador(es)	

Ação 6: Capacitar em dados abertos e reuso de dados

Atividade	Data de início	Data de término	Responsável	Resultado verificável	Acompanhamento
Elaborar projeto de detalhamento do programa de capacitação em dados abertos	Março/2021	Março/2021	CGU	Projeto do “Programa continuado de capacitação em dados abertos” elaborado	O projeto foi elaborado e está em fase de aprovação pela direção.
Realizar 1 evento de capacitação	Abril/2021	Junho/2021	CGU, eventualmente e com colaboração de outros órgãos	Capacitação realizada	O 1º evento de capacitação deverá ocorrer no mês de junho/2021.

AÇÃO 7: Reestruturação do Portal de Dados Abertos

AÇÃO 7	
Título da Ação	Ação 7. Reestruturação do Portal Brasileiro de Dados Abertos.
Descrição	<p>Solucionar problemas existentes e tornar a ferramenta mais amigável, facilitando o consumo de dados pelos usuários, assim como a interação entre consumidores e produtores de dados.</p> <ul style="list-style-type: none">• Otimizar a catalogação das bases e outros recursos, incorporar o cadastro e o monitoramento dos planos de dados abertos.• Disponibilizar funcionalidades para melhorar a navegação e a experiência do usuário, como melhores ferramentas de busca, notificação e avaliação das bases.• Possibilitar o monitoramento do uso dos dados e da atualização das bases, para subsidiar a gestão da Política de Dados Abertos.
Período de implementação	Abril/2021 a dezembro/2022
Órgão responsável pela ação	Controladoria-Geral da União

AÇÃO 7: Reestruturação do Portal de Dados Abertos

Atividade	Data de início	Data de término	Responsável / Envolvidos	Resultado verificável	Acompanhamento
Definição de funcionalidades a serem incorporadas ao novo portal de dados abertos	Abril/2021	Junho/2021	CGU	Relação de funcionalidades a serem incorporadas	<p>O documento de requisitos do novo portal está em elaboração. Contou com insumos de: (i) feedback de usuários e gestores coletados ao longo do monitoramento da política de dados abertos; (ii) benchmarking de portais internacionais; (iii) entrevistas realizadas com usuários e publicadores do Portal realizadas entre março e maio/2021; e pesquisa aplicada com publicadores do portal; e (v) workshops realizados com representantes da sociedade civil em 2019 (em Recife e em São Paulo).</p> <p>Foram solicitadas contribuições dos membros da INDA acerca de novas funcionalidades a serem implementadas.</p>

AÇÃO 7: Reestruturação do Portal

Atividade	Data de início	Data de término	Responsável / Envolvidos	Resultado verificável	Acompanhamento
Desenvolvimento do novo portal de dados abertos (fase 1)	Julho / 2021 Nova data: Nov/ 2021	Janeiro/ 2022 Nova data: Ago/ 2022	CGU	Funcionalidades da fase 1 implementadas	Data replanejada, devido à atraso do processo de contratação da empresa que desenvolverá a nova interface do Portal.
Homologação e lançamento do novo Portal da Dados Abertos (fase 1)	Fevereiro/ 2022 Nova data: Set/ 2022	Fevereiro/ 2022 Nova data: Set/ 2022	CGU	Novo portal disponibilizado ao público (requisitos da fase 1)	Data replanejada.
Desenvolvimento do novo portal de dados abertos (fase 2)	Março/ 2022 Nova data: Ago/ 2022	Out/ 2022 Nova data: Fev/ 2023	CGU	Funcionalidades da fase 2 implementadas	Data replanejada.
Homologação e publicação das novas funcionalidades do Portal da Dados Abertos (fase 2)	Novembro/ 2022 Nova data: Mar/ 2023	Dezembro/ 2022 Nova data: Mar/ 2023	CGU	Funcionalidades da fase 2 publicadas no Portal de Dados Abertos	Data replanejada

Ação 8: Ferramenta para catalogar bases de dados federais

AÇÃO 8	
Título da Ação	Ação 8. Catálogo de bases de dados federais
Descrição	Criar ferramenta para cadastro das principais bases de dados do governo federal, a fim de se manter um inventário com as características principais de cada base, mesmo que não sejam bases passíveis de abertura.
Período de implementação	Dezembro/2020 a Março/2021
Órgão responsável pela ação	Ministério da Economia
Órgão(s)/Entidade(s) colaborador(es)	CGU

Ação 8: Ferramenta para catalogar bases de dados federais

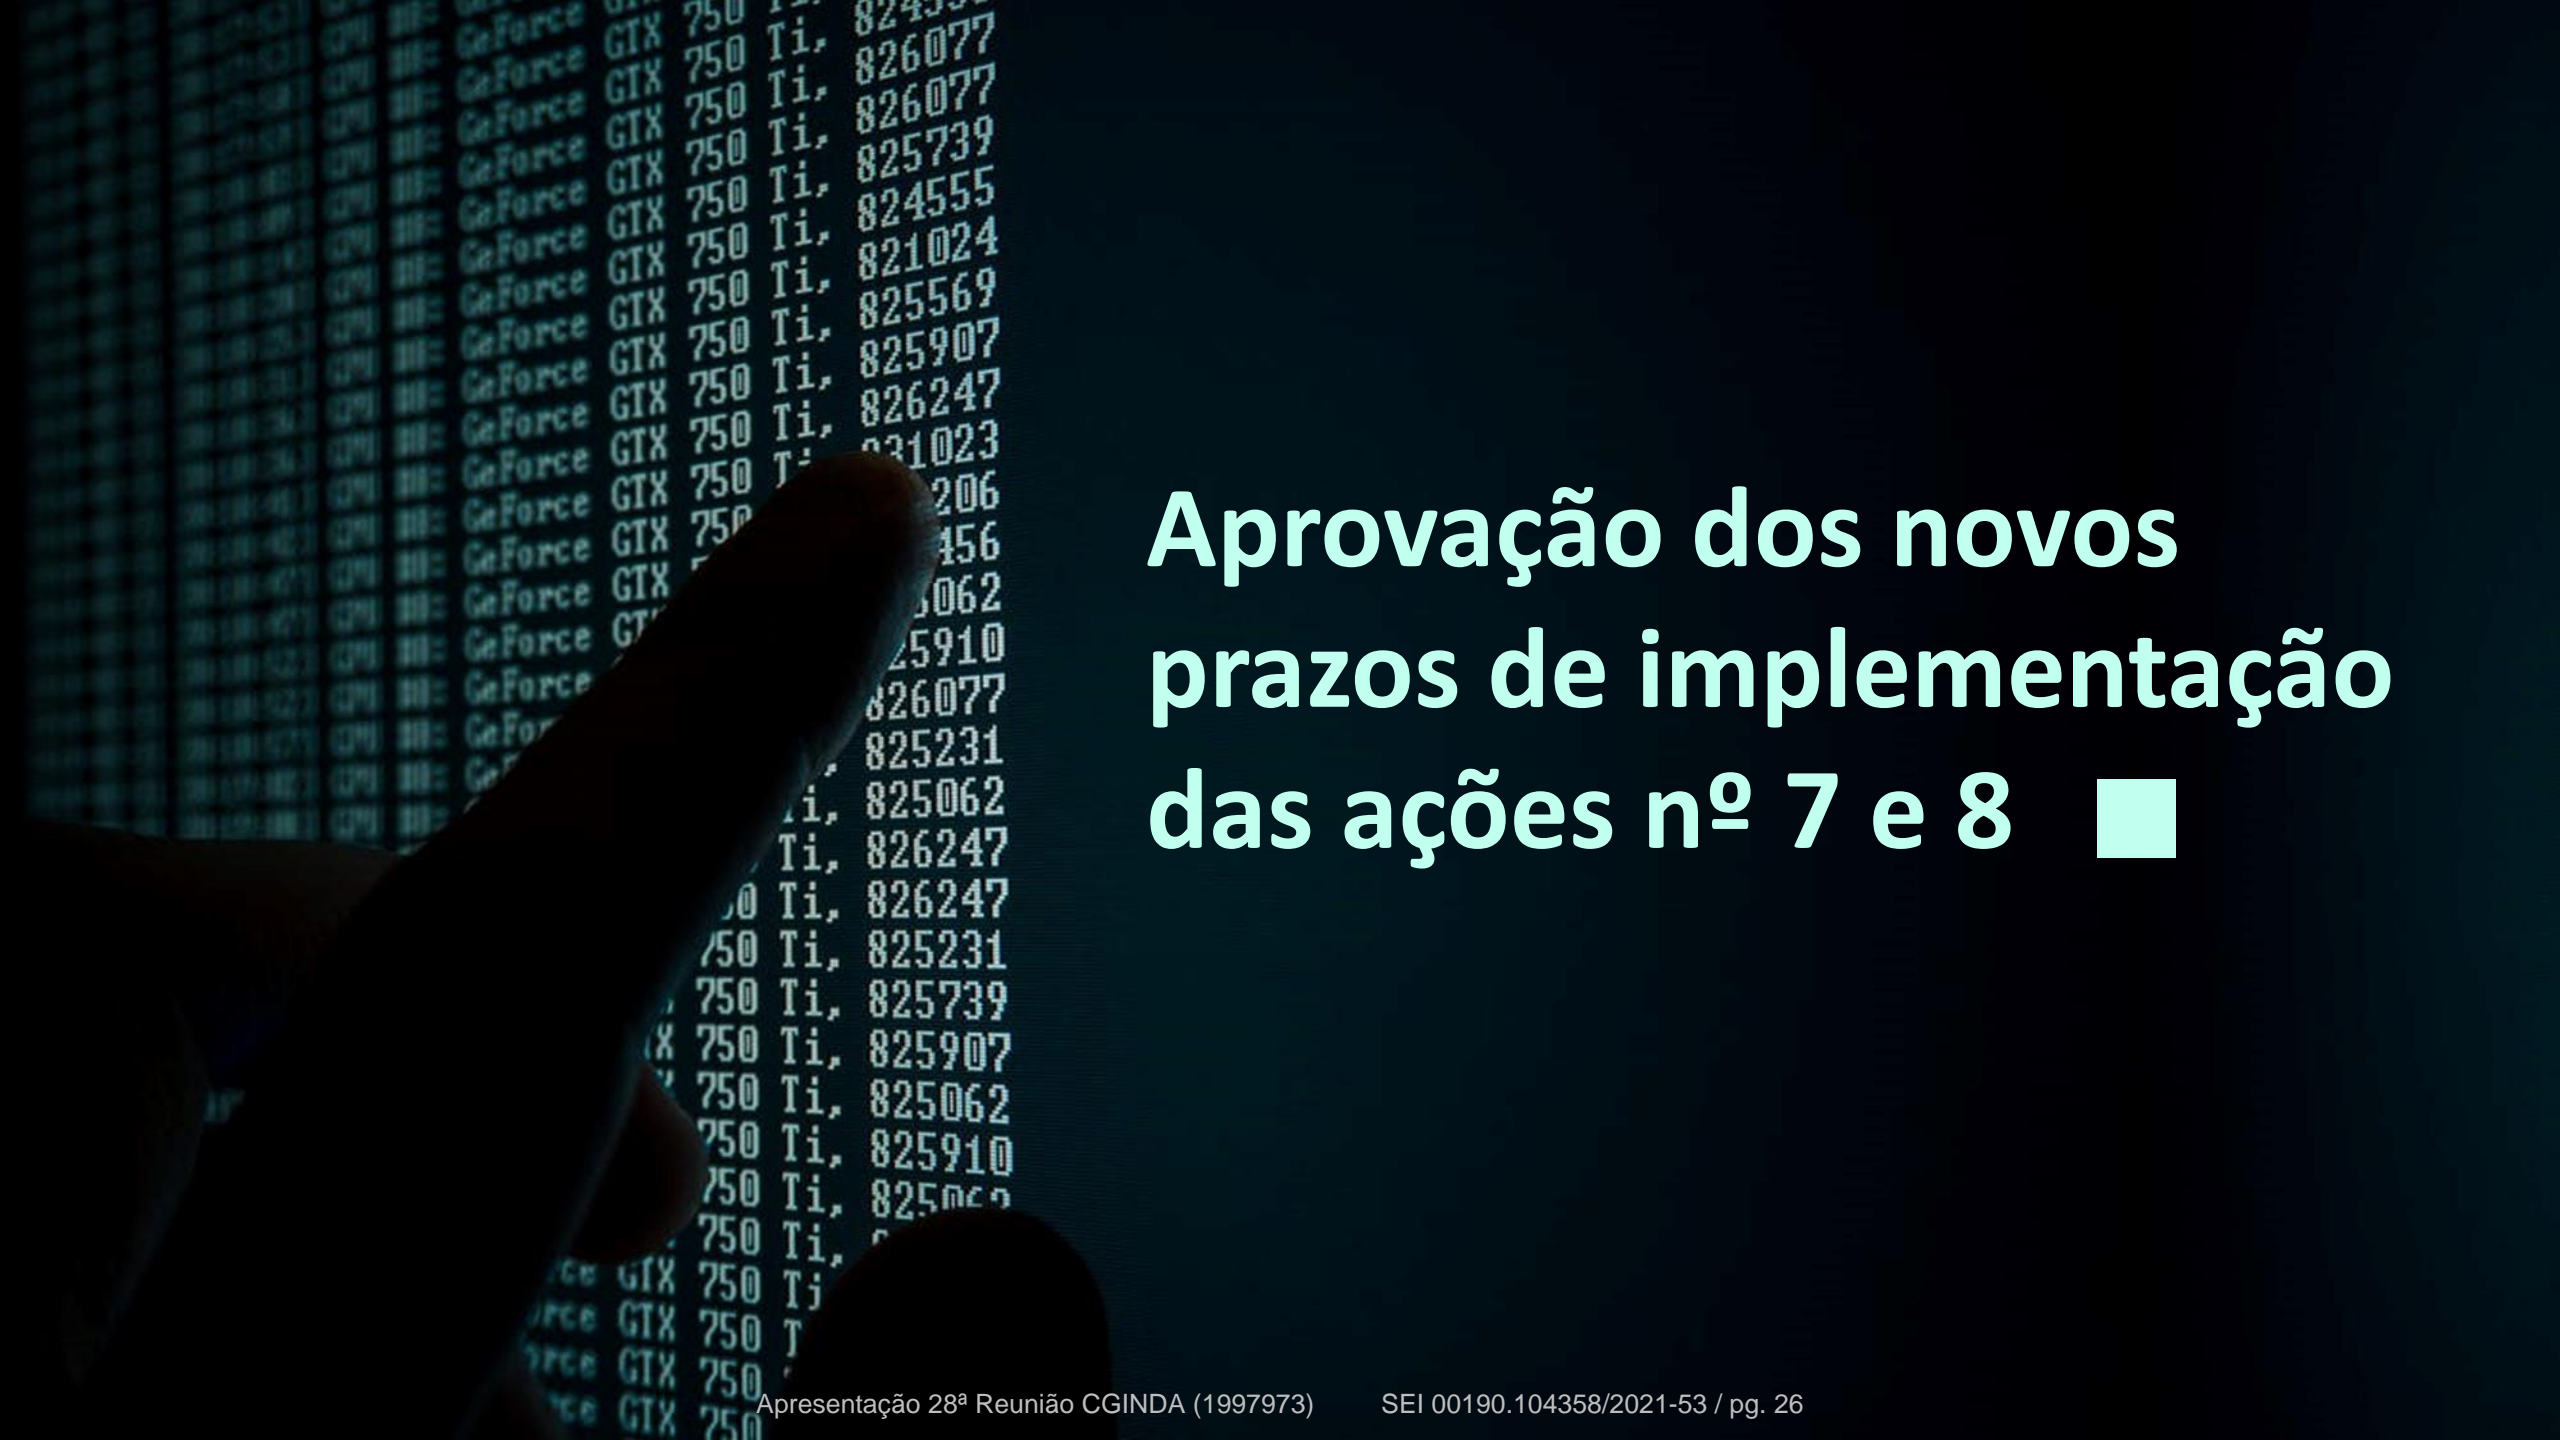
Atividade	Data de início	Data de término	Responsável / Envolvidos	Resultado verificável	Acompanhamento
Revisão do sistema versão 5.2	Dezembro / 2020	Março/2021	ME	Sistema implantado	Sistema em migração de ambiente (Jun/21)
Produção de material didático	Fevereiro/ 2021	Março/2021	ME	Material produzido	Material produzido
Evento de lançamento do Catálogo	Março/2021	Março/2021	ME	Evento realizado	Substituído por uma ação de contato direto com os órgãos, para revisão e qualificação dos respectivos cadastros

Ação 10: Aprimorar normativo da INDA

AÇÃO 10	
Título da Ação	Ação 10. Normativo de reestruturação da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - INDA
Descrição	Publicar normativo com as atualizações necessárias para a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos – INDA, a partir das contribuições da consulta pública realizada e dos membros do CGINDA e considerando potenciais lacunas na política.
Período de implementação	Março/2021 a dezembro/2021
Órgão responsável pela ação	Controladoria-Geral da União
Órgão(s)/Entidade(s) colaborador(es)	

Ação 10: Aprimorar normativo da INDA

Atividade	Data de início	Data de término	Responsável	Resultado verificável	Acompanhamento
Consolidação do texto final do normativo a partir das contribuições e validação pelos membros do CGINDA	Março/2021	Agosto/2021	CGU	Texto final consolidado	O texto está em fase de aprimoramento frente às contribuições dos integrantes da INDA.

A hand is pointing at a list of stock transactions on a screen. The list includes columns for stock type (GTX), quantity (750), company name (Ti.), and price (e.g., 826077, 825739, 824555, 821024, 825569, 825907, 826247, 821023, 825062, 825910, 826077, 825231, 825062, 826247, 826247, 825231, 825739, 825907, 825062, 825910, 825062).

Aprovação dos novos prazos de implementação das ações nº 7 e 8 ■

AÇÃO 7: Reestruturação do Portal de Dados Abertos

AÇÃO 7	
Título da Ação	Ação 7. Reestruturação do Portal Brasileiro de Dados Abertos.
Descrição	<p>Solucionar problemas existentes e tornar a ferramenta mais amigável, facilitando o consumo de dados pelos usuários, assim como a interação entre consumidores e produtores de dados.</p> <ul style="list-style-type: none">• Otimizar a catalogação das bases e outros recursos, incorporar o cadastro e o monitoramento dos planos de dados abertos.• Disponibilizar funcionalidades para melhorar a navegação e a experiência do usuário, como melhores ferramentas de busca, notificação e avaliação das bases.• Possibilitar o monitoramento do uso dos dados e da atualização das bases, para subsidiar a gestão da Política de Dados Abertos.
Período de implementação	Abril/2021 a dezembro/2022
Novo período de implementação	Abril de 2021 a Março de 2023
Órgão responsável pela ação	Controladoria-Geral da União

Ação 8: Ferramenta para catalogar bases de dados federais

AÇÃO 8	
Título da Ação	Ação 8. Catálogo de bases de dados federais
Descrição	Criar ferramenta para cadastro das principais bases de dados do governo federal, a fim de se mantenha um inventário com as características principais de cada base, mesmo que não sejam bases passíveis de abertura.
Período de implementação	Dezembro/2020 a Março/2021
Novo período de implementação	Dezembro/2020 a Dezembro/2021
Órgão responsável pela ação	Ministério da Economia
Órgão(s)/Entidade(s) colaborador(es)	CGU

Encaminhamentos

Ação	Responsável	Prazo
Publicar plano de ação revisado	CGU	15/06/2021
Organizar cronograma de reuniões do subgrupo de avaliação do novo Decreto da INDA	CGU	15/06/2021



OBRIGADA ■

dadosabertos@cgu.gov.br
